


Gemeinde Dischingen




-
- Tiefbauarbeiten
Eglinger Straße in Demmingen
 - Erneuerung der Trinkwasserleitung
„Am Dörrberg“
-

**- Gemeinderatsitzung-
26.07.2021**




Straßenausbau

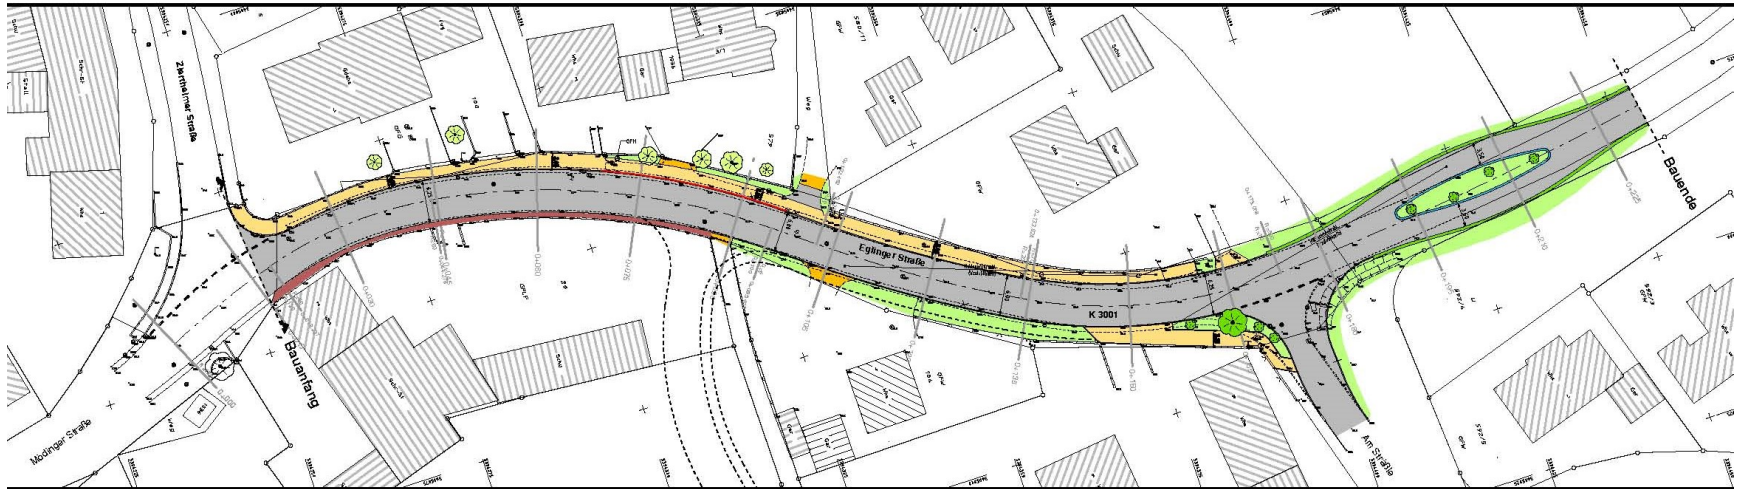




Kanalisationsmaßnahmen

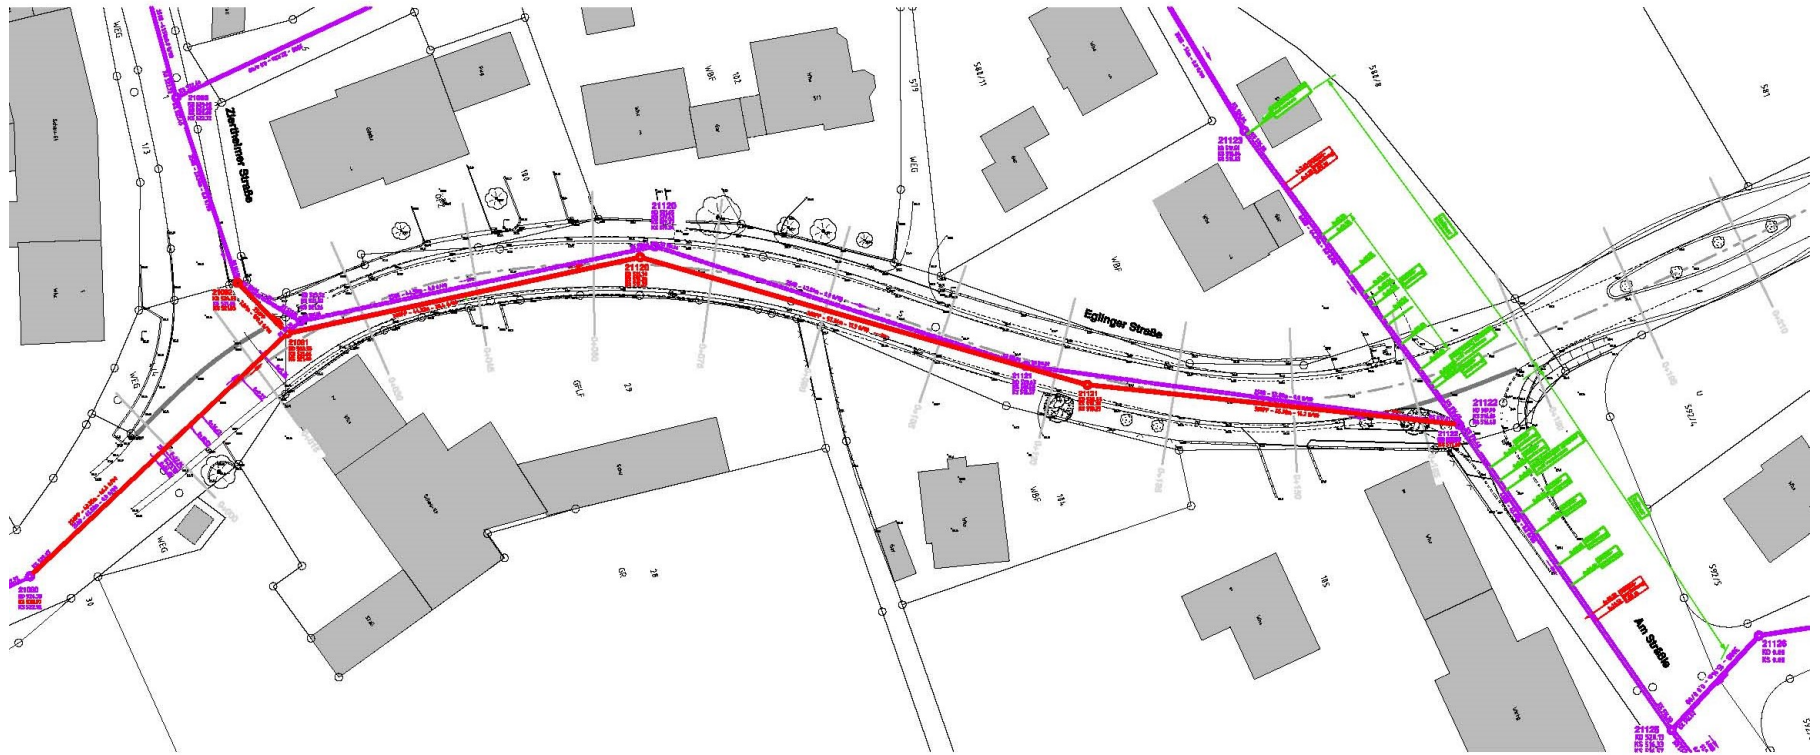




Erneuerung der Trinkwasserleitung

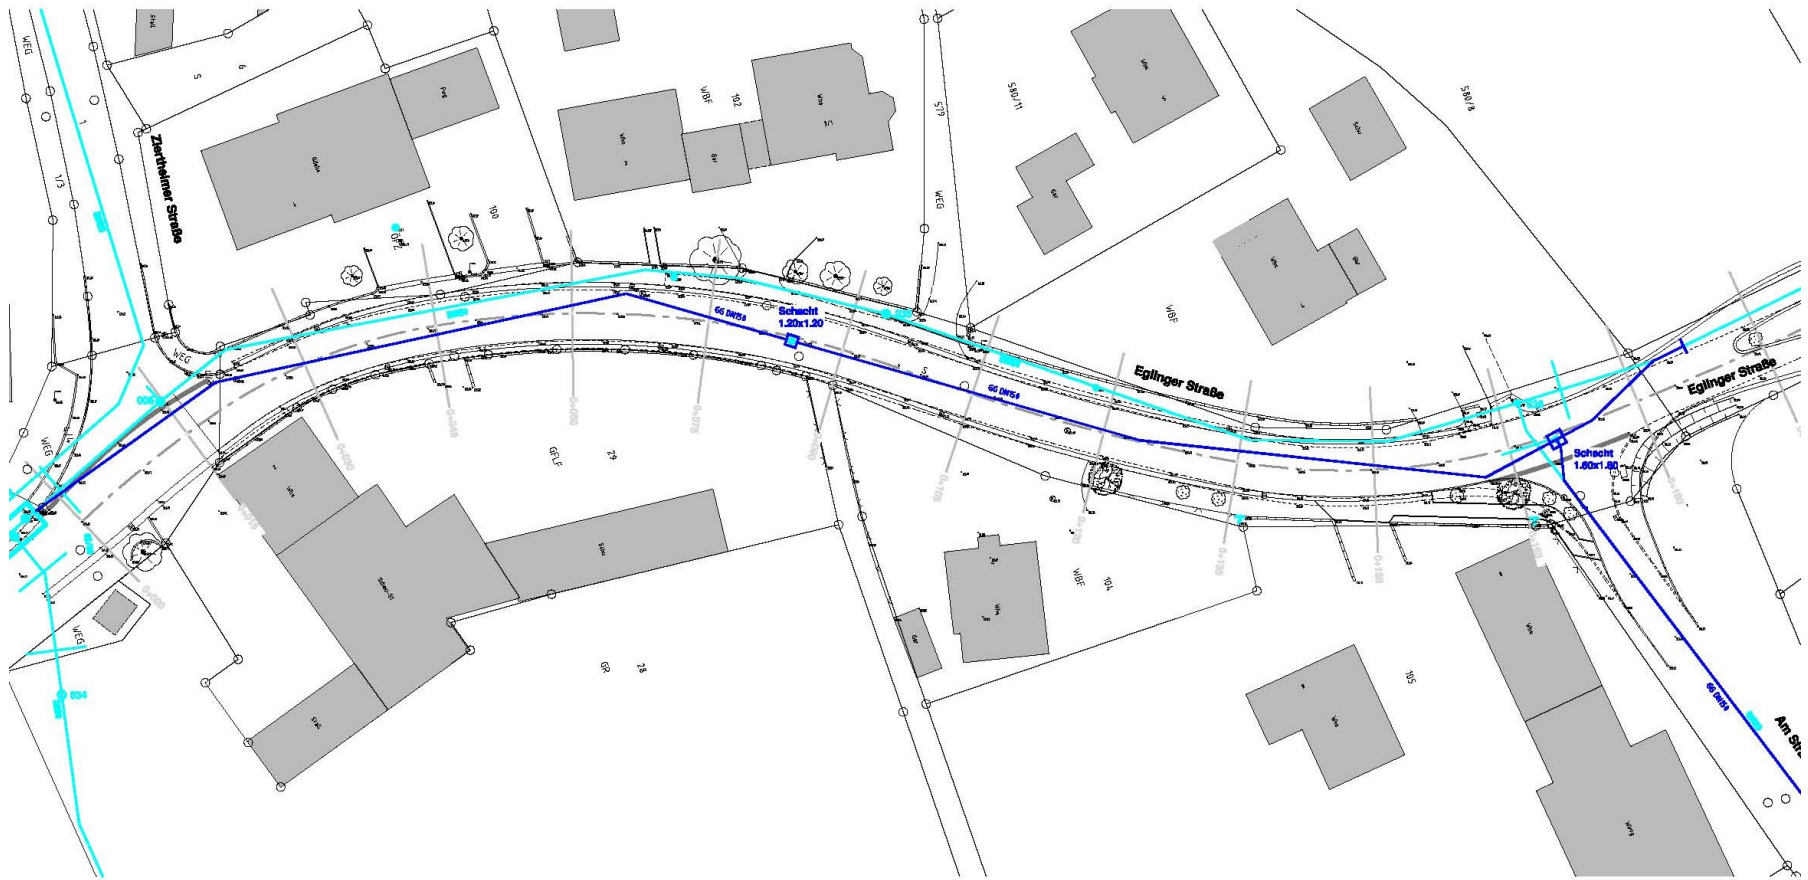



Erneuerung der Trinkwasserleitung

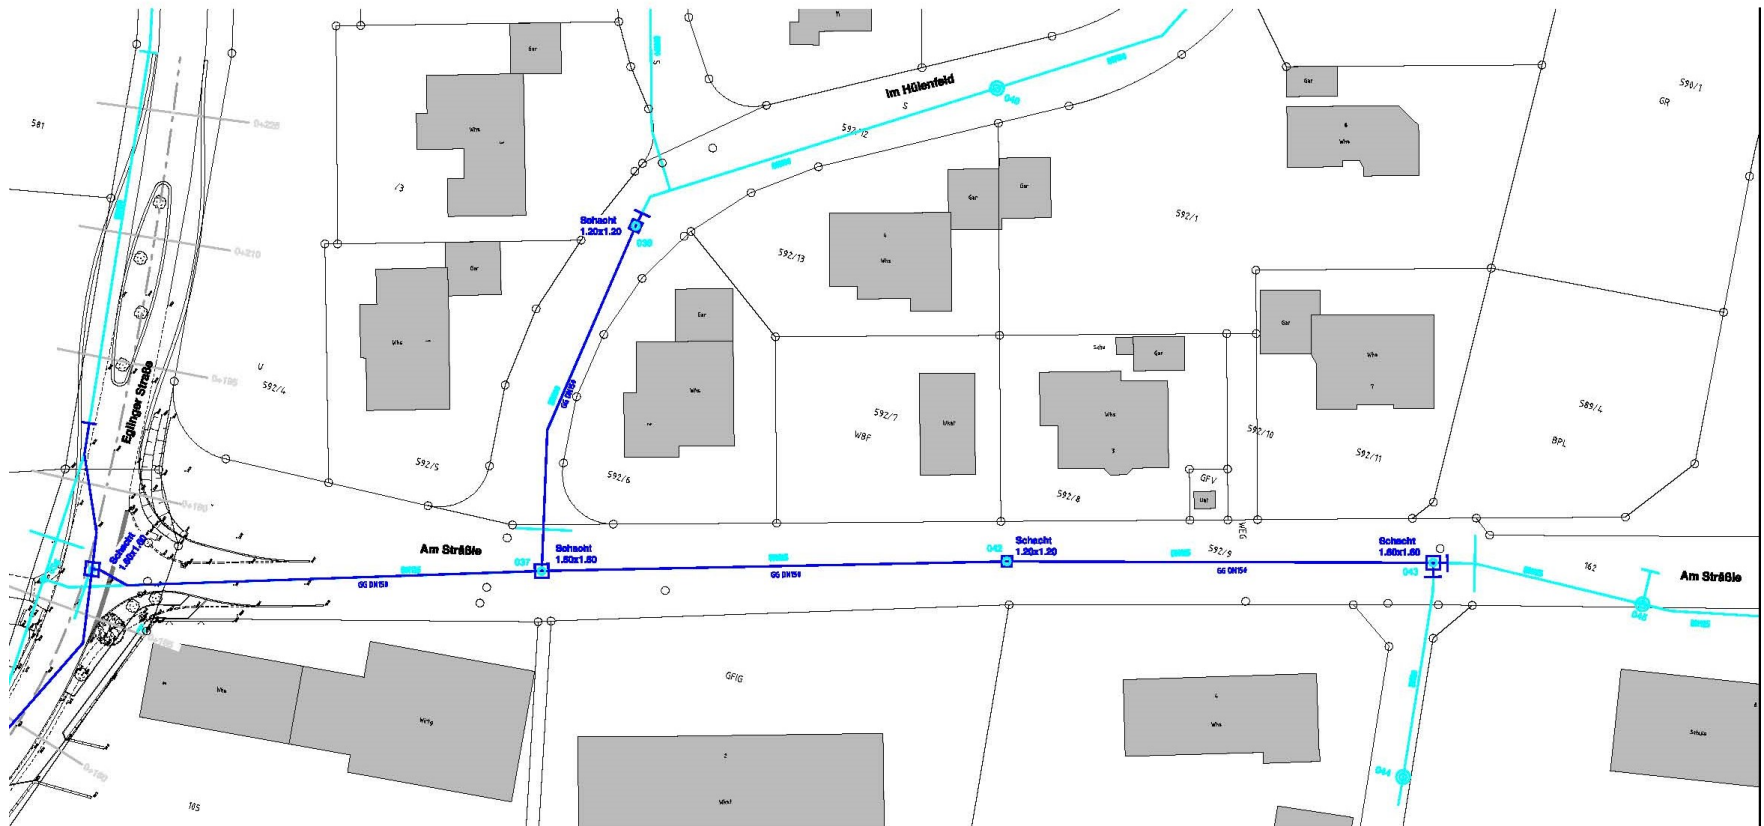





Kostenübersicht (Bauleitungen)

Gemeinde Dischingen

Tiefbauarbeiten in der Eglinger Straße

Kostenübersicht

		Kostenberechnung			Vergabe		
		Netto	MwsT	Brutto	Netto	MwsT	Brutto
Straßenbau Gemeinde		138.413,11 €	26.298,49 €	164.711,60 €	270.668,25 €	51.426,97 €	322.095,22 € ¹⁾
Kanalisationsmaßnahmen	Beihilfeantrag FrWW vom 17.09.201	168.493,94 €	32.013,85 €	200.507,79 € ¹⁾	140.535,43 €	26.701,73 €	167.237,16 €
Wasserversorgung	Beihilfeantrag FrWW vom 17.09.201	285.997,95 €	54.339,61 €	340.337,56 € ^{1) 2)}	159.915,70 €	30.383,98 €	190.299,68 €
Summe Gemeinde		592.905,00 €	112.651,95 €	705.556,95 €	571.119,38 €	108512,6822	679.632,06 €
TW-Leitung Am Dörrberg		118.000,00 €	22.420,00 €	140.420,00 € ²⁾	92.398,35 €	17.555,69 €	109.954,04 €
Landkreis Fahrbahn		166.393,09 €	31.614,69 €	198.007,78 €	162.096,50 €	30.798,34 €	192.894,84 €
Gesamtsumme		877.298,09 €	166.686,64 €	1.043.984,73 €	825.614,23 €	156.866,70 €	982.480,93 €

1) einschließlich Asphalt-Tragschicht im Leitungsgraben

2) einschließlich Rohrlieferung und Verlegung



Ausschreibungsergebnis

Ausschreibungsergebnis vom 22.07.2021

Bieter	Angebots- summe (Brutto) €	%	Bemerkungen
Scharpf-Tiefbau GmbH & Co. KG 89447 Zöschingen	982.480,93	100,0	
Bieter 2	996.319,21	101,4	--
Bieter 3	1.031.136,77	105,0	
Bieter 4	1.075.642,44	109,5	--
Bieter 5	1.111.254,31	113,1	
Bieter 6	1.149.821,98	117,0	3 % Nachlass berücksichtigt
Bieter 7	1.158.584,01	117,9	--

Vergabevorschlag:

Nach Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird vorgeschlagen dem annehmbarsten Angebot den Zuschlag zu erteilen:

Bieter : Vergabe an den preisgünstigsten Bieter, die
Firma Scharpf Scharpf Tiefbau GmbH & Co KG, 89447 Zöschingen
zum **Angebotspreis** von brutto **982.480,93 €**

Aufgestellt:
Steinheim, 23.07.2021



Terminplan



Gemeinde Dischingen
Marktplatz 9, 89561 Dischingen

Terminplanung: Ausbau der Eglinger Straße in Demmingen

- Ausführungsplanung: KW 20-24/2021
- LV-Erstellung: KW 22-25/2021
- Veröffentlichung Staatsanzeiger: 23.06.2021
- Veröffentlichung Tagespresse: 26.06.2021
- LV-Ausgabe: 28.06.2021
- Submission: 19.07.2021
- Vergabe: 26.07.2021
- Baubeginn: ab KW 34/2021 (nach
Absprache)
- Bauende: Ende Juni 2022

Aufgestellt:

Steinheim, den 03.05.2021 / 21.05.2021



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit**
